

工 事 概 要 書

工事名 三重大学(観音寺)附属中学校体育館等改修電気設備工事

資料リスト

電気設備工事発注概要書

観音寺団地配置図

三重大学施設部			
部長	課長	副課長	担当者
園田	安田	竹内	中川 泉

電気設備工事発注概要書

年 度		令和8年度			
工 事 名		三重大学(観音寺)附属中学校体育館等改修電気設備工事			
工事場所		三重県津市観音寺町471(三重大学観音寺団地構内)			
完成期限		令和9年2月26日(金)			
配置図		別図による			
本件に関する照会先		三重大学施設部施設管理チーム (TEL:059-231-9925)			
工 事 概 要	建 物 概 要	棟名称	体育館	屋内運動場	武道場
		工事種別	模様替	模様替	模様替
		構造・階数	RS1	RS2	R1
		建築面積	(822)m ²	(1, 333)m ²	(392)m ²
		延べ面積	(820)m ²	(1, 273)m ²	(350)m ²
		改修延べ面積	820m ²	-	-
		改修延べ面積 計	820m ²	-	-
		()内の数値は、当該既設建物の面積			
	屋 内 工 事	電灯設備	○	○	○
		動力設備	○	○	○
		雷保護設備	・	・	・
		受変電設備	・	・	・
		構内情報通信網設備	○	・	・
		構内交換設備	○	・	・
		映像・音響設備	○	・	・
		拡声設備	○	・	・
		誘導支援設備	・	・	・
		防犯・入退室管理設備	○	・	・
		火災報知設備	○	・	・
		中央監視制御設備	・	・	・
屋 外 工 事	構内配電線路	○	○	○	
	構内通信線路	○	・	・	
		・	・	・	
		・	・	・	

I. 工事内容

本事業は、建設後60年が経過し、老朽化により施設設備の安全面、機能面において大規模改修の時期を迎えている附属中学校体育館の全面改修及び屋内運動場、武道場の空調設置に伴う電源工事を行うものである。


Ⅱ.工程計画

	令和8年					令和9年				備考
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
体育館		準備工	本工事							完成日：R9年2月26日
武道場		準備工	本工事							
屋内運動場		準備工			本工事					

完成日: R9年2月26日

建物関係凡例

凡 例	内 容
	本工事建物

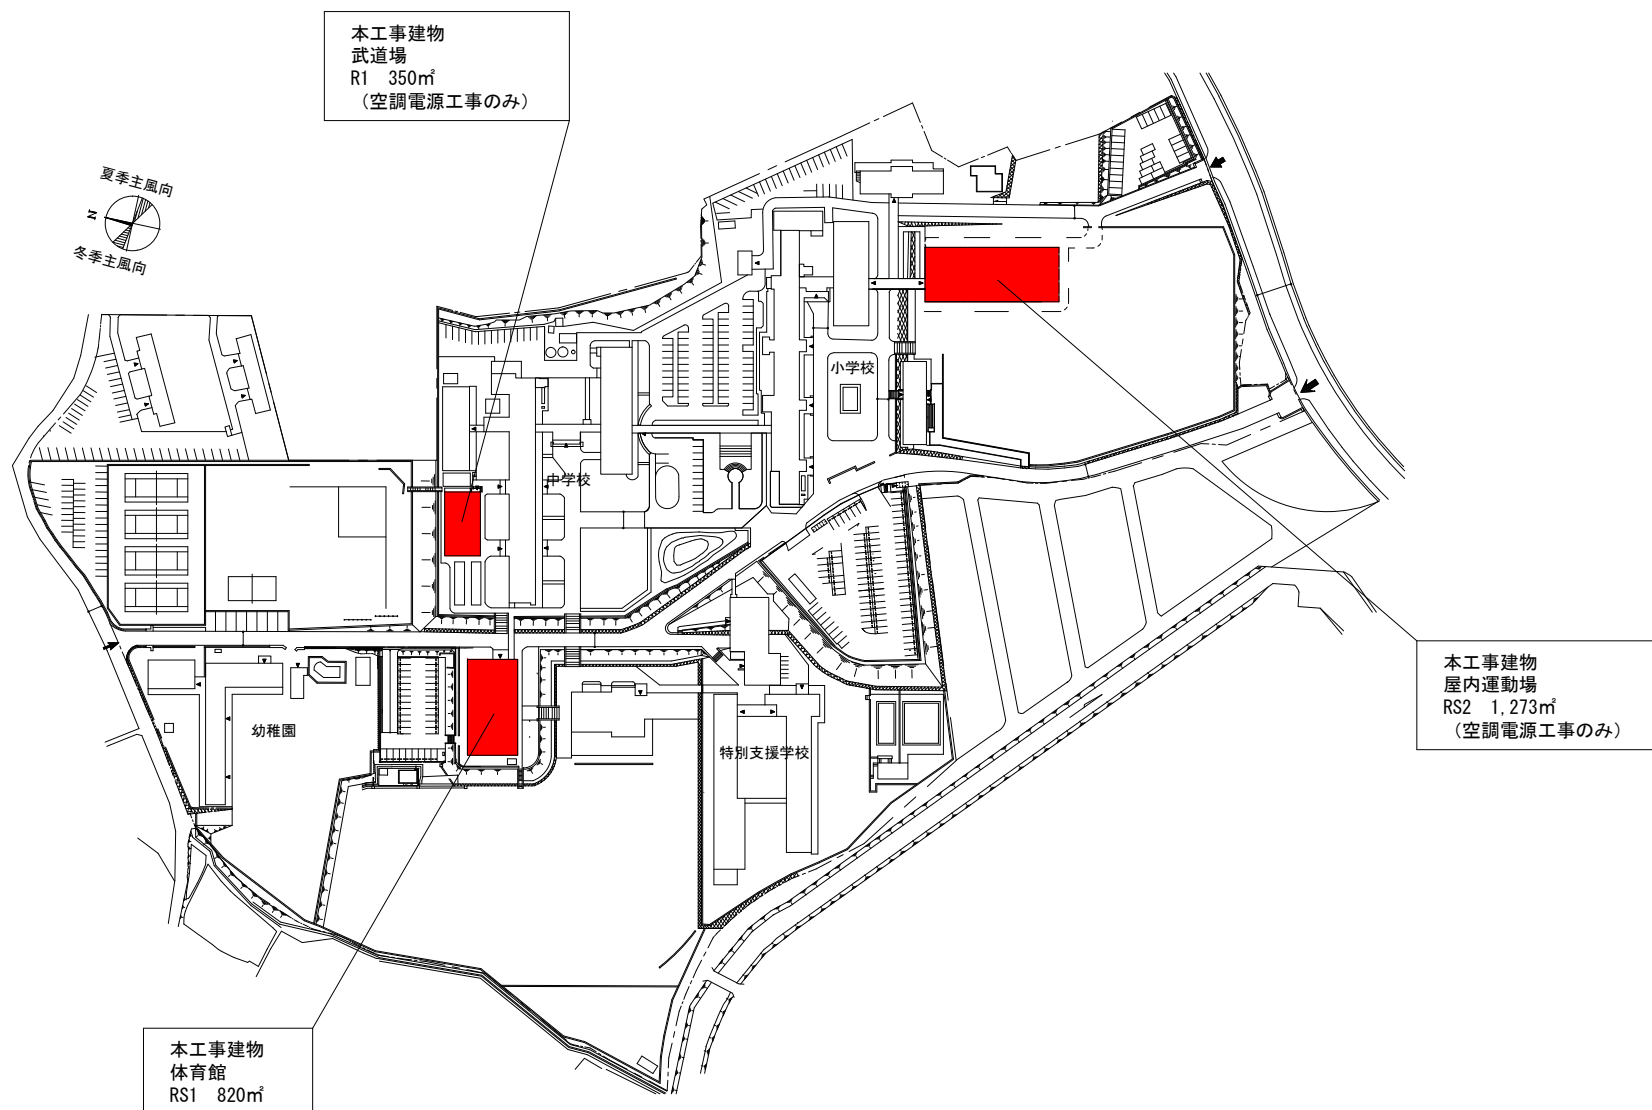

工事名

三重大学（観音寺）附属中学校体育館等改修電気設備工事

配 置 図

1/3000
